


Są już trzy, zaraz będą cztery. Trwają intensywne prace przy ostatniej trybunie na stadionie ŁKS

13.01.2021 15:46 Małgorzata Loeffler / ZIM

kategoria: **Aktualności ZIM**

Łódź Buduje

Na półmetku jest też budowa dachu. Co jeszcze powstanie na nowym stadionie?

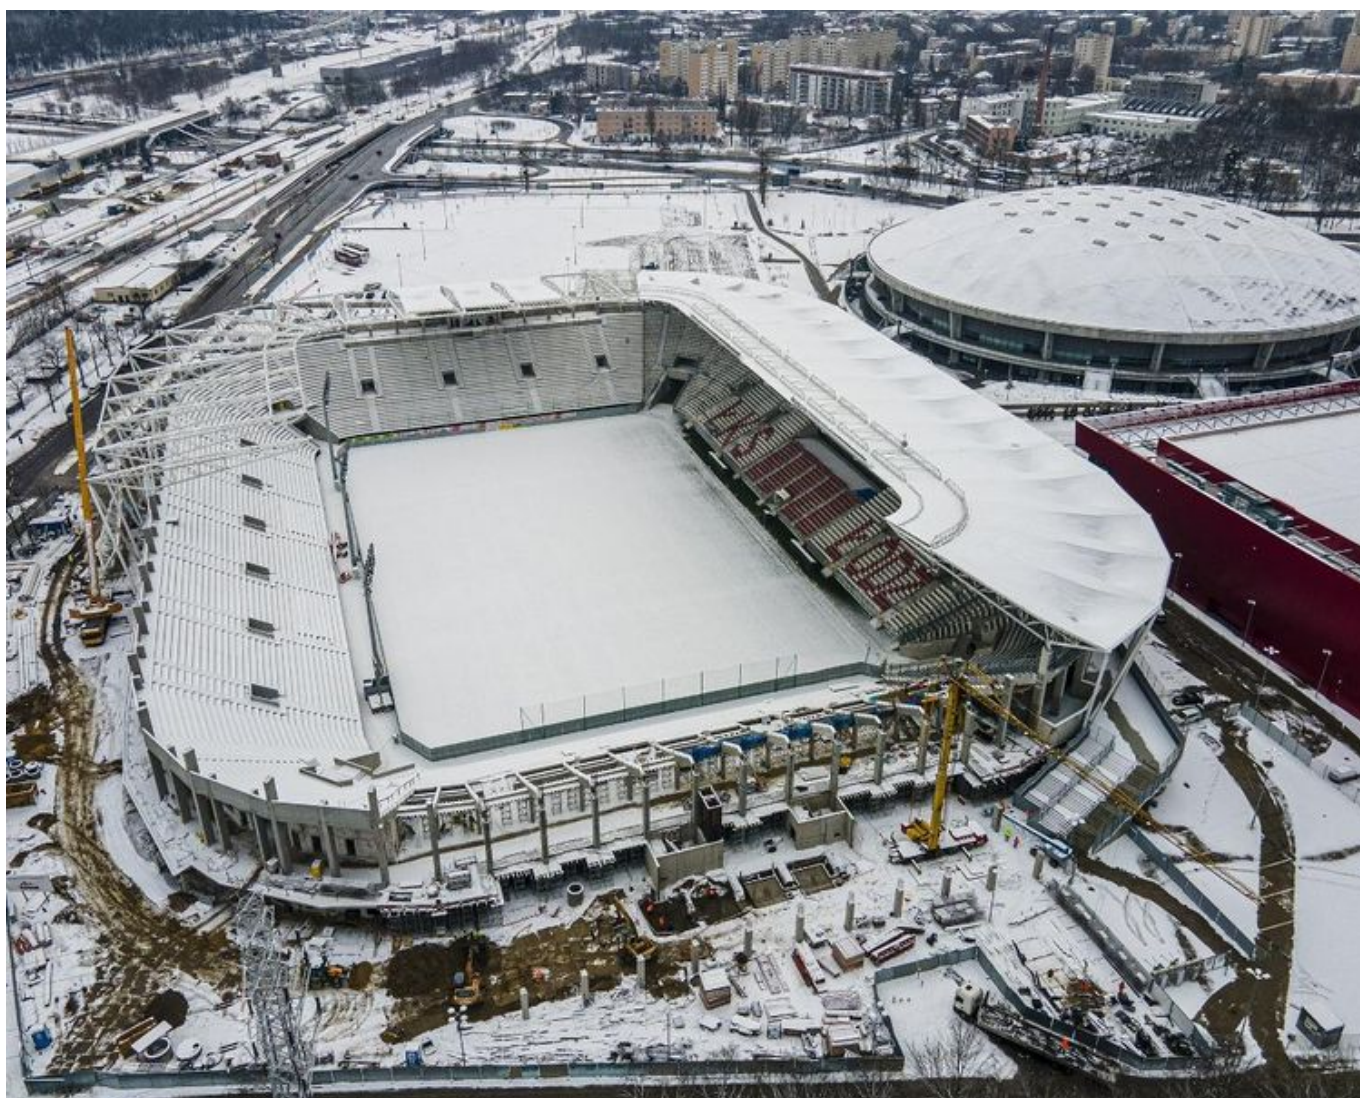

Przy al. Unii trwa montaż dachu oraz rozpoczęły się intensywne prace przy budowie ostatniej, północnej trybuny stadionu

- Budowa stadionu Łódzkiego Klubu Sportowego pomimo ograniczeń związanych z pandemią postępuje bez zakłóceń i opóźnień. I to widać, stadion rośnie na naszych oczach. Konstrukcje trybuny południowej i wschodniej są już skończone. Trwa montaż dachu oraz rozpoczęły się intensywne prace przy budowie ostatniej, północnej trybuny stadionu. Zgodnie

Są już trzy, zaraz będą cztery. Trwają intensywne prace przy ostatniej trybunie na stadionie ŁKS

z wcześniejszymi zapowiedziami prowadzimy transporty i montaż elementów stalowych konstrukcji dachu na stadionie. I jesteśmy już na półmetku. Rozbudowa cieszy zarówno piłkarzy, jak i kibiców. Stadion to będzie również przestrzeń dla przedsiębiorców. W budynku biurowym trybuny północnej na 3 kondygnacjach będą znajdować się przestrzenie biurowe open space o łącznej powierzchni około 3100 m. kw. - mówi Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi.

Na parterze trybuny południowej będą znajdować się powierzchnie przeznaczone pod muzeum, sklep i biura. Natomiast na parterze trybuny wschodniej zarezerwowano przestrzeń na restaurację. Na kondygnacji +2 trybuny wschodniej i południowej znajdować się będą kioski gastronomiczne.

- Do końca stycznia zakończymy montaż konstrukcji stalowej na trybunie wschodniej. Konstrukcja stalowa i żelbetowa trybuny południowej zostanie zakończona wiosną bieżącego roku. Termin umowny zakończenia prac to czerwiec 2022 roku, ale podtrzymuję deklarację, że prace budowlane na stadionie zakończymy do końca bieżącego roku. Oprócz prac konstrukcyjnych na obiekcie trwają również prace instalacyjne oraz wykonywane są roboty murarskie - dodaje Tomasz Sałata, Mirbud S. A.

- Postęp prac na stadionie widać, i jest to naprawdę imponujące. Cieszę się z tego jako Łodzianin, i jako kibic Łódzkiego Klubu Sportowego. Już dziś zaczynamy prace związane z opracowaniem brandingu oraz wyposażeniem stadionu - dodaje Paweł Bliźniuk, przewodniczący komitetu sterującego ds. budowy stadionu

Zakres inwestycji:

Budowę zadaszonych trybun od strony wschodniej i południowej (o konstrukcji i technologii wykonania analogicznej jak istniejącej trybuny zachodniej) wraz z zagospodarowaniem terenu, pełną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem. Zaprojektowanie i budowę zadaszonych trybun od strony północnej o konstrukcji i technologii wykonania analogicznej jak istniejącej trybuny zachodniej wraz z niezależnym budynkiem biurowym, zagospodarowaniem terenu, pełną infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem.

Charakterystyka stadionu:

- długość wraz ze schodami zewnętrznymi: 210,70m,
- szerokość do zewnętrznej krawędzi zadaszania: 119,84m,
- wysokość elewacji do wewnętrznej krawędzi zadaszania: 25,82 m,
- wymiary boiska: 68 m x 105 m,
- pojemność stadionu po rozbudowie: minimum 18 tys. miejsc.

Roboty budowlane – wykonane:

- fundamenty trybuny południowej i wschodniej – 100%,
- przekładka sieci gazowej kolidującej z budową trybuny wschodniej – 100%,
- kanał technologiczny w trybunie południowej i wschodniej – 100%,
- słupy i ściany parteru w trybunie południowej i wschodniej – 100%,
- słupy parteru w trybunie wschodniej – 100%,
- kanalizacja podposadzkowa w trybunie południowej i wschodniej – 100%,
- chudy beton (pierwsza warstwa posadzkowa) w trybunie południowej i wschodniej – 100%,
- strop parteru trybuny południowej i wschodniej – 100%,
- belki grzebieniowe prefabrykowane: trybuna południowa i wschodnia – 100%,
- płyty audytoryjne prefabrykowane: trybuna południowa i wschodnia – 100%,
- womitoria trybuny południowej i wschodniej – 100%,
- oczepy fundamentowe – 100%.

Trwające roboty budowlane:

- kanał technologiczny trybuny północnej – obecne zaawansowanie 95%,
- roboty fundamentowe trybuny północnej – obecne zaawansowanie (część stadionowa 95%, część biurowa 50%),
- ściany i belki nad parterem trybuny południowej i wschodniej – 95%,
- budowa dachu nad stadionem – 50% (dla całości) - (konstrukcja stalowa na trybunie

południowej 95%, na trybunie wschodniej 50%).

