

ZDiT-DO.0511.289.2015

Łódź, dnia 25 sierpnia 2015 r.

Pan
Włodzimierz Tomaszewski
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi

Wiceprezydent Miasta Łodzi


ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel.: +48 (42) 638 41 11
fax +48 (42) 638 44 17
e-mail: k.piatkowski@uml.lodz.pl
www.lodz.pl

Wanowmy Panie Radny

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 14 lipca 2015 r. w sprawie terminu realizacji systemu sterowania w ramach projektu Trasy W-Z i konsekwencji z tego wynikających uprzejmie informuję, że na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia opóźnienia terminu wykonania ww. zadania, w związku z powyższym nie ma ryzyka utraty środków unijnych.

Przedłużająca się z powodu odwołań innych oferentów, procedura przetargowa na wybór Wykonawcy i w konsekwencji rozpoczęcie przez niego prac w miesiącach zimowych spowodowało, że Wykonawca miał możliwość realizacji robót budowlanych w pełnym zakresie dopiero od miesiąca marca. W chwili obecnej Inżynier Kontraktu oraz Zamawiający nie widzą żadnego zagrożenia w realizacji umowy w terminie. Prace przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Na dzień 10 lipca 2015 r. wykonano około 50 % przewidzianych do realizacji skrzyżowań oraz około 63 % odcinków kanalizacji teletechnicznych. Wykonawca zgłosił kolejne firmy podwykonawcze (razem 10).

Na uwagę zasługuje fakt, że pomimo bardzo skomplikowanego procesu inwestycyjnego przy budowie Trasy W-Z, w tym realizacja umowy przez kilku Wykonawców, konieczność uzgadniania wejść w teren z właścicielami nieruchomości, wiele kolizji z infrastrukturą podziemną, prowadzenie prac w ścisłym centrum miasta i na głównym ciągu komunikacyjnym, Inżynier wraz z Zamawiającym dołożyli należytej

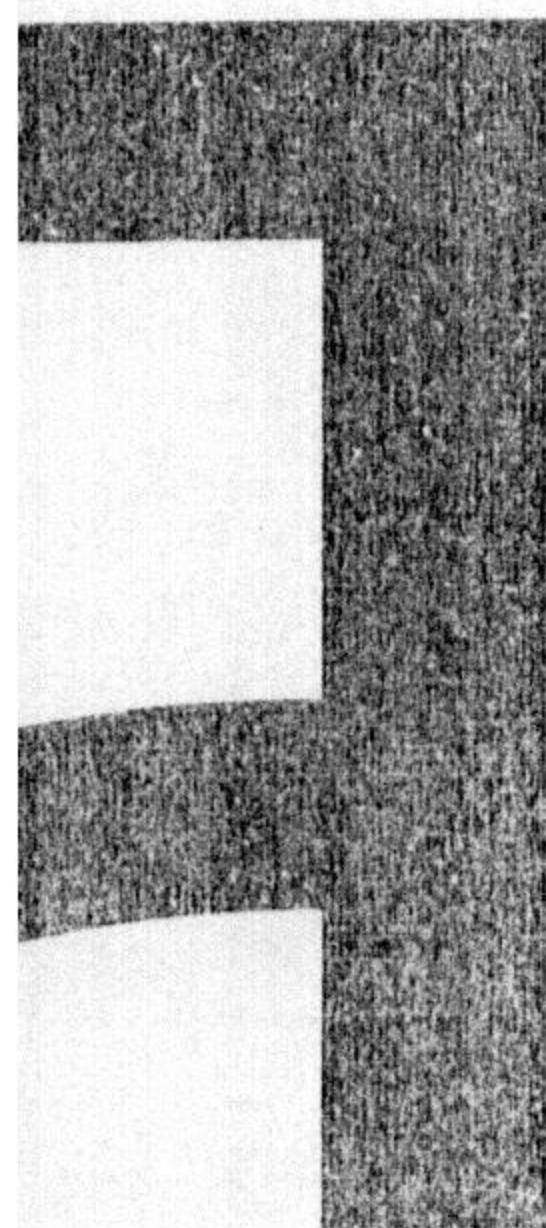

staranności w realizacji umowy co spowodowało brak jakichkolwiek opóźnień w realizacji inwestycji z winy Zamawiającego.

Z poważaniem

Wiceprezydent Miasta Łodzi



Krzysztof PIĄTKOWSKI

Do wiadomości:

- 1) Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
- 2) Wydział Organizacyjno-Administracyjny w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ

Łódź, dnia 23 lipca 2015 r.

ZDIT-DO.0511.289.2015

~~Pan
Włodzimierz Tomaszewski
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi~~

W związku z interpelacją złożoną przez Pana Radnego w okresie międzysesyjnym w dniu 14 lipca 2015 r. w sprawie terminu realizacji systemu sterowania w ramach projektu Trasy W-Z i konsekwencji z tego wynikających uprzejmie informuję, że odpowiedź zostanie udzielona Panu Radnemu w terminie do dnia 25 września 2015 r.

Wiceprezydent Miasta Łodzi



Krzysztof PIĄTKOWSKI

Do wiadomości:

- 1/ Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
- 2/ Wydział Organizacyjno-Prawny w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ
