

Łódź, dnia 29 października 2012 r.



ZDIT-DO.0521.94.2012

Pan
Adam Wieczorek
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel.: +48 (42) 638 41 16
fax +48 (42) 638 42 16
e-mail: sekretariat.wiceprezydenta@uml.lodz.pl
www.lodz.pl


W związku z interpelacją Pana Radnego złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 19 października 2012 r. w sprawie w sprawie remontu torowiska tramwajowego w skrzyżowaniu ulic Rzgowskiej i Paderewskiego, uprzejmie informuję co następuje.

Ad 1. Wszystkie prace remontowe dotyczące torowisk tramwajowych wykonywane są przez MPK Łódź Sp. z o.o., zgodnie z umową nr 3341-2/28/EF/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. o świadczenie usług publicznych w ramach organizacji lokalnego transportu zbiorowego.

Ad 2. Remont torowiska w skrzyżowaniu ulic Rzgowskiej i Paderewskiego przebiegał zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę i uzgodnionym w Zarządzie Dróg i Transportu. Powyższy harmonogram przewidywał zakończenie robót do dnia 6 października 2012 r.

Prace remontowe rozpoczęły się w dniu 21 lipca 2012 r., a dopuszczenie ww. skrzyżowania do ruchu odbyło się w dniu 6 października 2012 r. Z przyczyn technologicznych m.in. z uwagi na konieczność etapowania prac oraz zachowania czasu niezbędnego do uzyskania odpowiednich parametrów wytrzymałościowych podbudowy torowiska, powyższy remont nie mógł zakończyć się wcześniej.

Ad 3. Biorąc pod uwagę powołany wyżej harmonogram Wykonawca nie przekroczył terminu wykonania przedmiotowych prac remontowych i w związku z tym nie ma podstaw do nałożenia na niego kar finansowych.

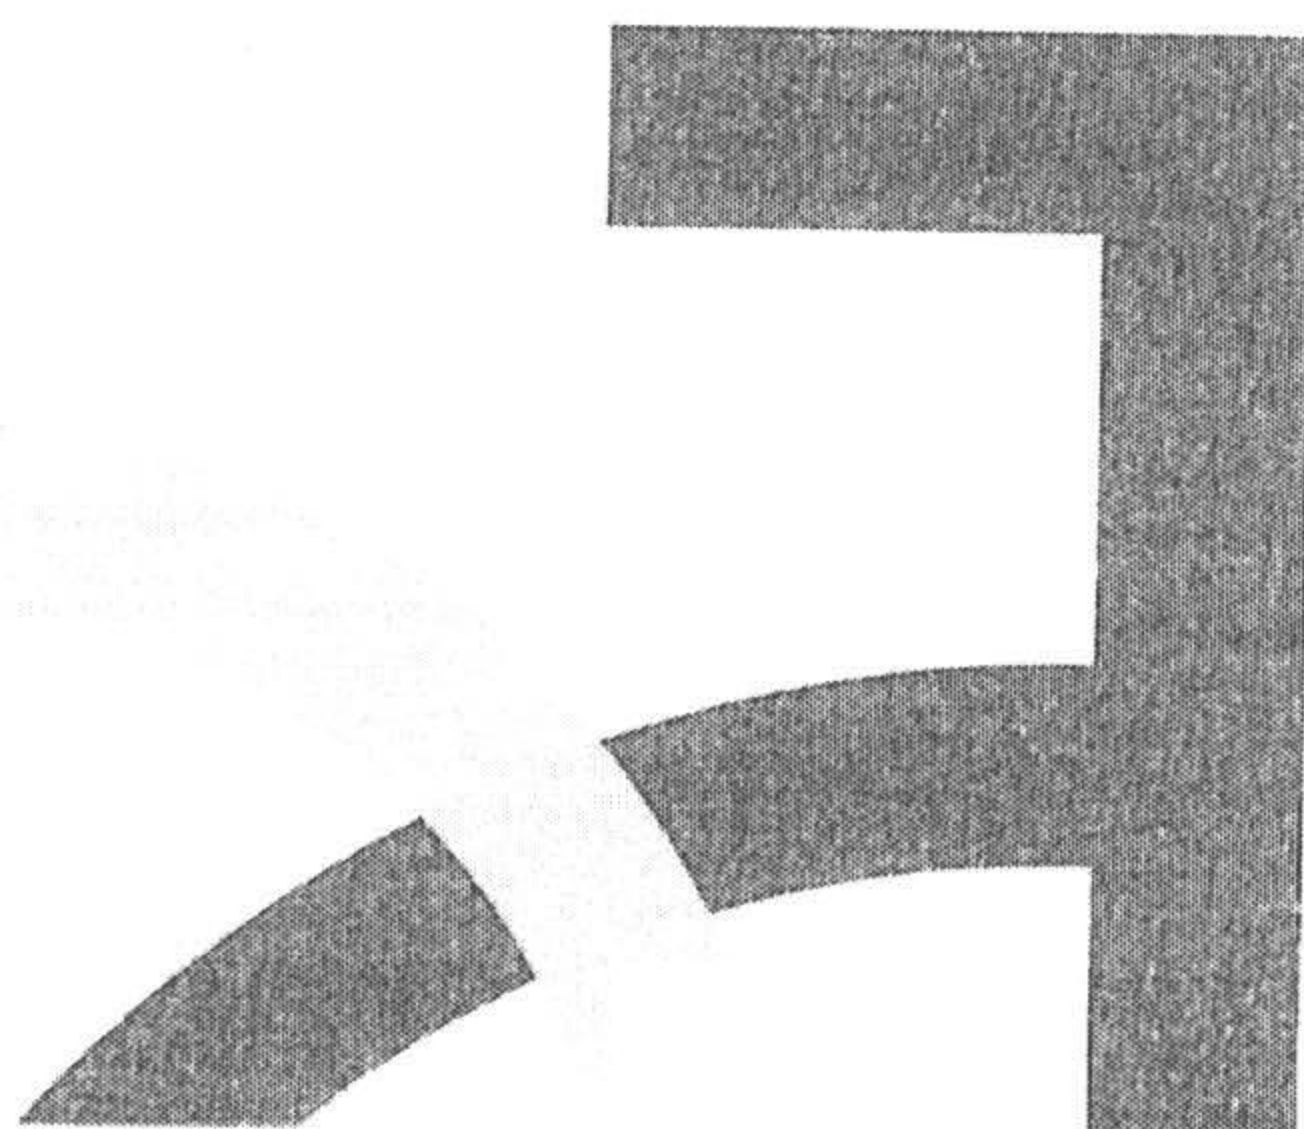

Ad 4. W trakcie trwania remontu, inspektorzy ZDiT dokonywali wizji lokalnych w miejscu budowy oceniając m. in. postęp prac i realizowanie przez Wykonawcę założeń technologicznych konstrukcji remontowanego torowiska tramwajowego.

Ad 5. Podczas przeprowadzania czynności odbiorowych stwierdzono konieczność skorygowania istniejącej różnicy w wysokościach rzędnych nawierzchni jezdni w stosunku do rzędnych torowiska. Prace te zostaną wykonane do dnia 11 listopada br. Nie stwierdzono natomiast uchybień technicznych ani technologicznych w wykonaniu torowiska tramwajowego i elementów jego wyposażenia.



WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI



Radosław STĘPIEŃ

Do wiadomości:

- 1) Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi,
- 2) Wydziału Organizacyjnego w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ.
